




**Les marchés des écluses et systèmes de  
Passel à Aubencheul-au-Bac | SECTEUR 5**

# Travaux de parachèvement

**2 consultations  
6 lots**

**Informations prévisionnelles  
sous réserve de publication**

BÂTIMENTS TOURISTIQUES ET D'EXPLOITATION DES 6 ÉCLUSES		
<b>Marché n°</b>	<b>551</b>	<b>Gros œuvre</b>
<b>Lot n°</b>	<b>D2L1</b>	
Durée estimée du marché		30 mois
Estimation budgétaire	Entre 1 et 5 M€	
Période de publication	S1 2028	Procédure AOO*
Période de notification	S2 2028	Démarrage des travaux S1 2029

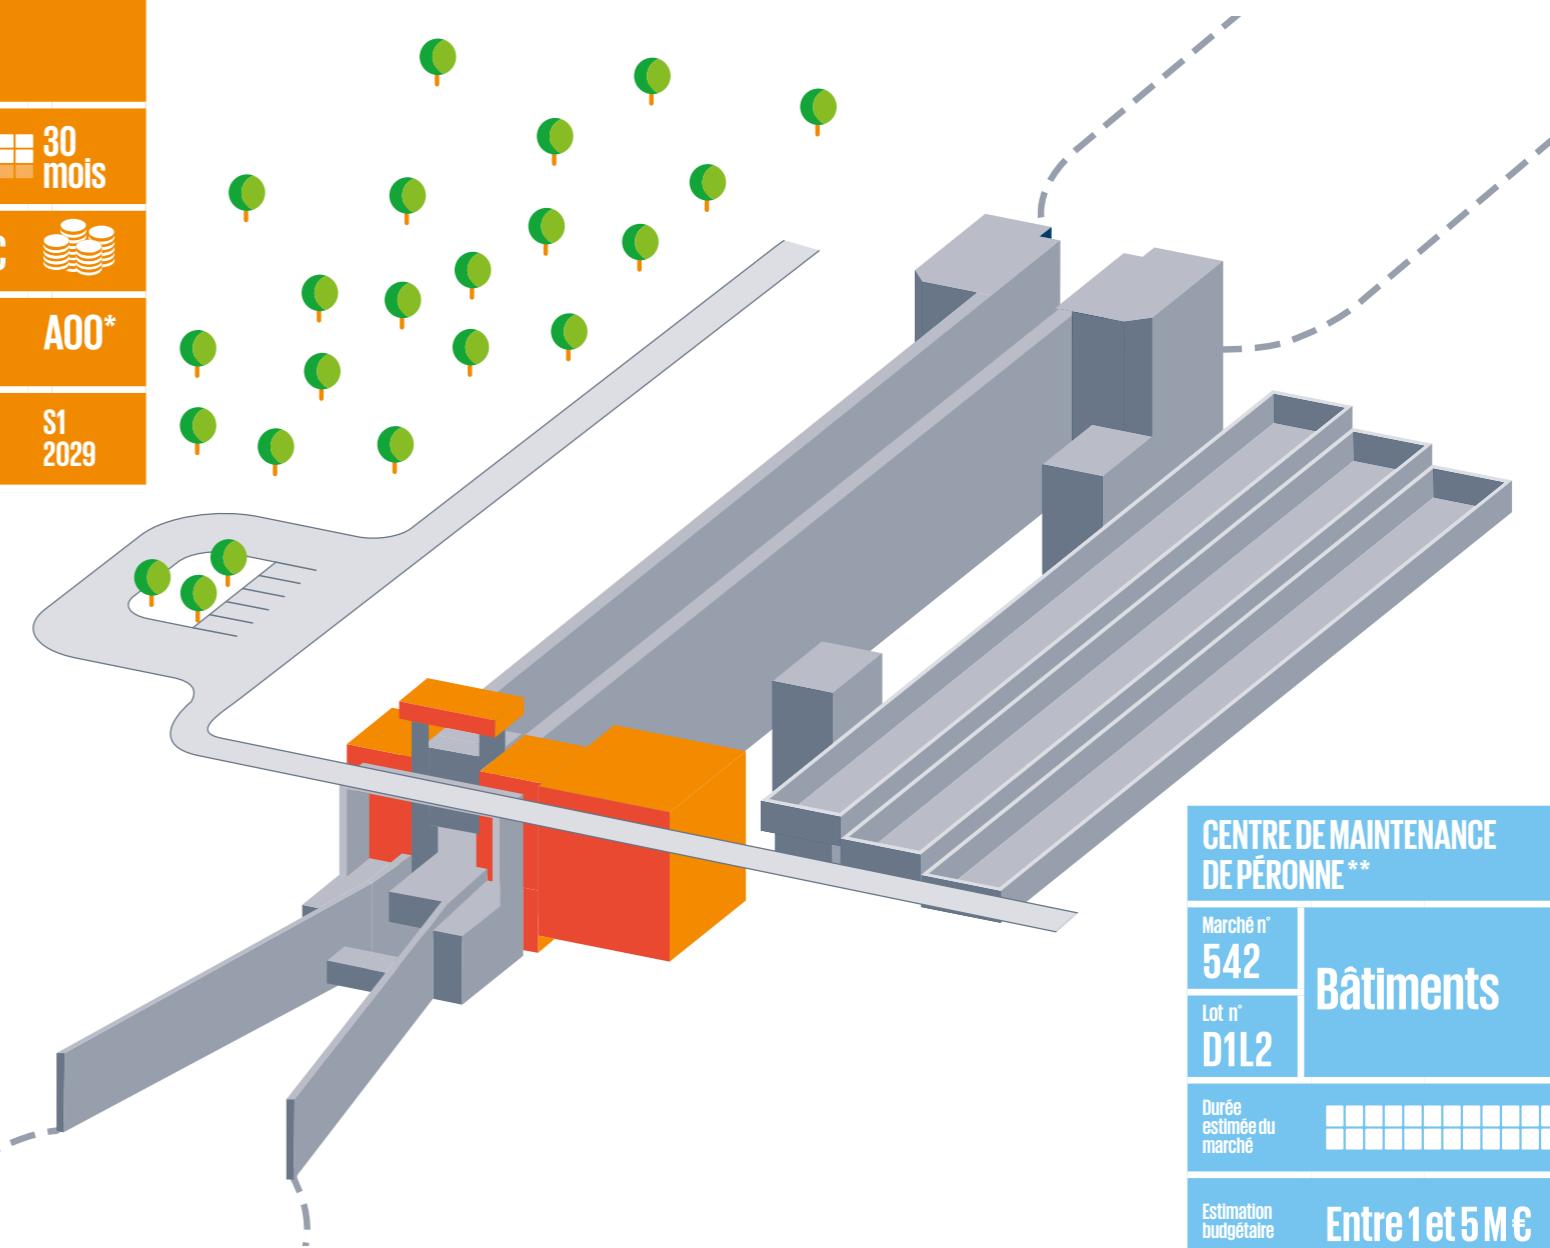

BÂTIMENTS TOURISTIQUES ET D'EXPLOITATION DES 6 ÉCLUSES		
<b>Marché n°</b>	<b>552</b>	<b>Second œuvre</b>
<b>Lot n°</b>	<b>D2L2</b>	
Durée estimée du marché		30 mois
Estimation budgétaire	Entre 0,2 et 0,5 M€	
Période de publication	S2 2028	Procédure AOO*
Période de notification	S1 2029	Démarrage des travaux S2 2029

BÂTIMENTS TOURISTIQUES ET D'EXPLOITATION DES 6 ÉCLUSES		
<b>Marché n°</b>	<b>553</b>	<b>Lots techniques</b>
<b>Lot n°</b>	<b>D2L3</b>	
Durée estimée du marché		30 mois
Estimation budgétaire	Entre 0,2 et 0,5 M€	
Période de publication	S2 2028	Procédure AOO*
Période de notification	S1 2029	Démarrage des travaux S2 2029

BÂTIMENTS TOURISTIQUES ET D'EXPLOITATION DES 6 ÉCLUSES		
<b>Marché n°</b>	<b>554</b>	<b>Ascenseurs</b>
<b>Lot n°</b>	<b>D2L4</b>	
Durée estimée du marché		15 mois
Estimation budgétaire	Entre 50 et 200 K€	
Période de publication	S2 2028	Procédure AOO*
Période de notification	S1 2029	Démarrage des travaux S2 2029

CENTRE DE MAINTENANCE DE PÉRONNE **		
<b>Marché n°</b>	<b>541</b>	<b>VRD et paysage</b>
<b>Lot n°</b>	<b>D1L1</b>	
Durée estimée du marché		24 mois
Estimation budgétaire	Entre 1 et 5 M€	
Période de publication	S2 2029	Procédure AOO*
Période de notification	S1 2030	Démarrage des travaux S2 2030

\* AOO Appel d'offres ouvert

\*\* Centre de maintenance localisé sur le port intérieur de Péronne
